



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO GERAL 1491/2023
Data: 23/10/2023 - Horário: 13:01
Administrativo - OFC 634/2023

Câmara Municipal de Juína - MT

Ofício n.º 303/GAB/JUÍNA/2023

Juína-MT, 23 de outubro de 2023

Ao Excelentíssimo
Fabiano Aurélio Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal de Juína

RECEBEM
23/10/23
Solange Pereira da Rosa
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

ASSUNTO: UPA, ESTUFAS, PAVIMENTAÇÃO, PROJETOS DA PRAÇA MÓDULO 06 E UBS MÓDULO 05

Excelentíssimo Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, segue informações pertinentes aos assuntos citados.

UPA:

Em relação a reforma e ampliação da UPA uma obra de suma importância para o município, houve o processo de licitação e a empresa vencedora a AVIN CONSTRUTORA apresentou várias dificuldades em concluir os serviços e a qualidade deixava a desejar, após várias reuniões e conversas infelizmente a empresa não cumprindo com o contrato, ficando mais de 30 dias sem aparecer na UPA, fomos obrigados a fazer a rescisão contratual e aplicada uma multa de 10% do saldo restante.

Diante dos fatos estamos agora em caráter de URGÊNCIA atualizando a planilha orçamentária e acrescentando um aditivo que já estava sendo elaborado e faremos uma nova licitação, onde esperamos que uma empresa séria e responsável seja a vencedora para a conclusão da obra.

A reforma é um processo complicado onde tem que ser realizado por etapas, tendo em vista que não se pode fechar a UPA, e não tem como não causar transtornos aos servidores e pacientes, tal a necessidade de que seja executada de forma rápida, ágil e eficiente.

ESTUFAS:

Quanto a execução das Estufas foi feito aditivo de valor e estava concluído a construção de todas as 13 unidades.

Recentemente antes da entrega oficial das Estufas, houve fortes ventos em nossa cidade o que causou grandes prejuízos, principalmente



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

PROTÓCOLO GERAL 1491/2023
Data: 23/10/2023 - Horário: 13:01
Administrativo - Ofc 834/2023

Câmara Municipal de Juína - MT

na ZONA RURAL, e uma Estufa ficou praticamente destruída, e entendem que foi um FENÔMENO NATURAL, estamos analisando a possibilidade de alocar recursos para a reconstrução da mesma e fazer a entrega de todas elas oficialmente.

PAVIMENTAÇÃO AV. LONDRINA E SÃO PAULO:

A Empresa que havia ganhado a licitação abandonou a obra alegando que os recursos seriam poucos para a execução da mesma, sendo assim foi feita a rescisão e um novo processo licitatório onde a empresa AMPLA ENGENHARIA sendo a vencedora está em fase final da drenagem, onde foi necessário uma DRENAGEM DIFERENCIADA no encontro das duas avenidas devido as infiltrações de água, e em vistoria na última sexta-feira junto com o proprietário da empresa, foi comprovado a qualidade da drenagem feita e restando somente 50m de tubulação e uma boca de lobo, a topografia final para ser feita, a base e a sub base foram feitas ontem (domingo) e em breve será executada toda a pavimentação.

PRAÇA MÓDULO 06 e UBS DO MÓDULO 05:

Foi solicitado pelos nobres vereadores os projetos da PRAÇA DO MÓDULO 06 e UBS do MÓDULO 05 em torno do CISC, e como ainda estavam em fase de elaboração não foi possível atender à solicitação.

Sabemos que é o momento de solicitar emendas a Deputados Federais e Senadores, e quanto aos Deputados Estaduais todos terão à disposição para o próximo ano o valor de R\$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais) em emendas.

Os projetos foram concluídos, e posso informar os valores de cada um, e encaminhar o LAYOUT de cada, tendo em vista que os projetos complementares e estruturais não são necessários no momento.

Havendo a possibilidade de recursos oriundos do Estado ou Federal, temos que inserir o projeto no sistema SIGCON ou na plataforma dos ministérios, conseguindo os recursos seria economia para o município tendo em vista que o prefeito Paulo Veronese irá executar essas obras com recursos próprios.

Segue os valores das obras:




MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO


PROTOCOLO GERAL 1491/2023
Data: 23/10/2023 - Horário: 13:01
Administrativo - OFC 634/2023


Câmara Municipal de Juína - MT

OBRA	VALOR
UBS do Módulo 05	R\$ 1.4742.680,85
Praça do Módulo 06	R\$ 2.246.253,65

Sem mais para o momento, subscrevo-me com protestos de elevada estima, consideração e apreço


Robson Amorim Machado
Chefe de Gabinete
Prefeitura Municipal de Juína-MT

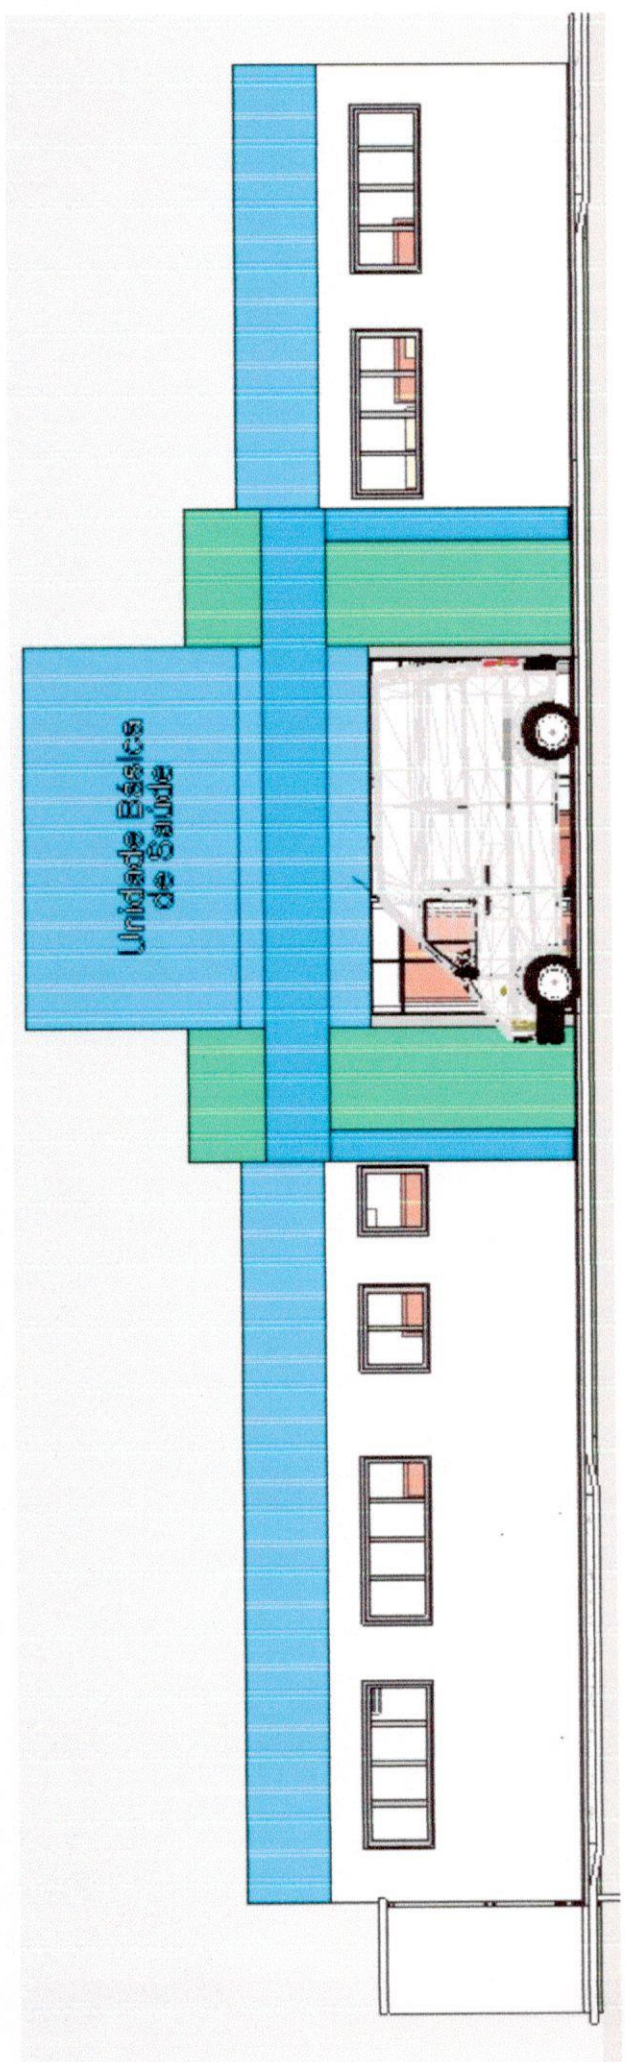

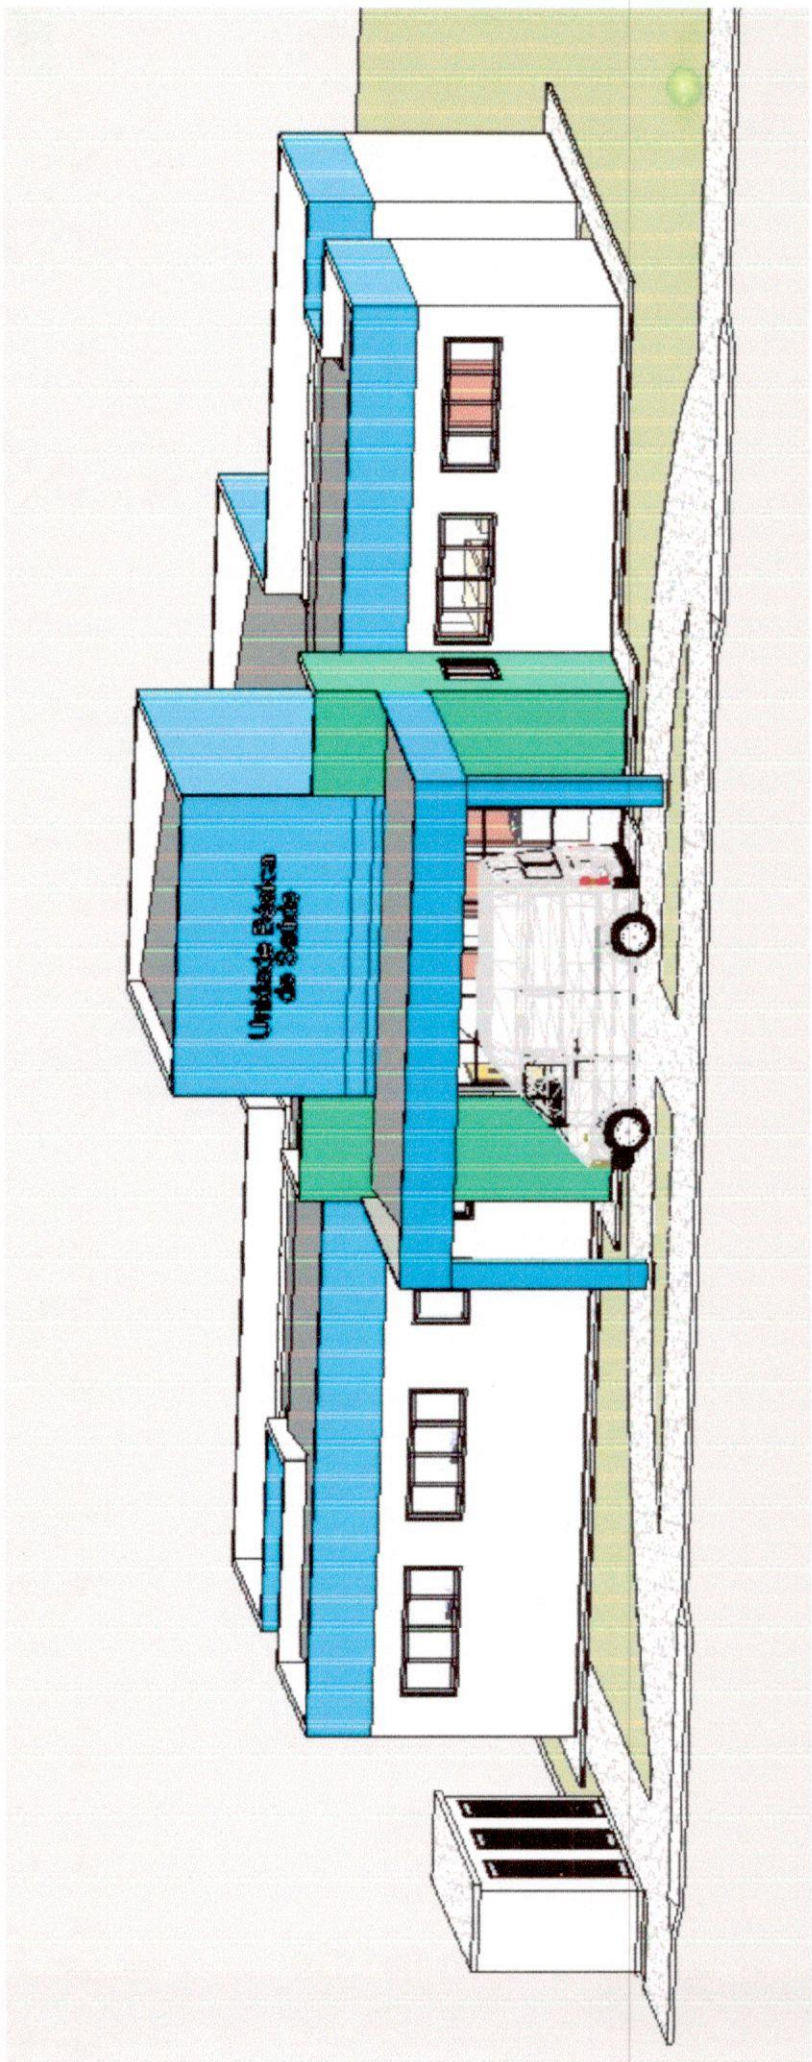



Rua Presidente Prudente

Rua Nova Granada

Rua Campos de Jordão

